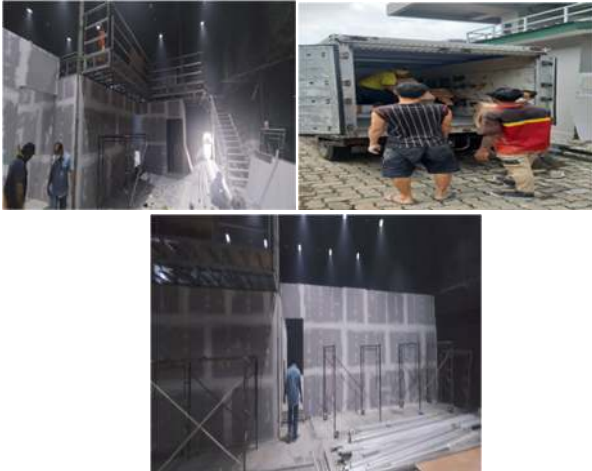


WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	25 Juni 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	03 Juli 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
25 Jun '22	1. Melanjutkan pekerjaan ruang Bridge simulator, Tug simulator, Ship stability dan ruang instruktur	
26 Jun '22	1. Pemasangan lapisan raised floor 2. Pembongkaran Material konstruksi ERC dan Gypsum ke ruangan pekerjaan	
27 Jun '22	1. Melanjutkan pemasangan gypsum ruang Bridge simulator, Tug simulator, Ship stability dan ruang instruktur 2. Pembongkaran material supreme kabel dan panel box	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410

Telephone: 021-2605 1621

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com

**PT. AMAN REJEKI INDONESIA**

Integrated Solutions

28 Jun '22	1. Pemasangan console Bridge Simulator 2. Pemasangan console Tug Simulator 3. Pemasangan gypsum ruangan mezzamin	
29 Jun '22	1. Penarikan kabel listrik dari panel utama ke ruang ship stability/CBT, tug simulator dan bridge simulator dan 2. Pembuatan 4 buah panel box listrik	
30 Jun '22	1. Lanjutan proses pekerjaan penarikan kabel listrik 2. Lanjutan proses pekerjaan pembuatan panel box	
1 Jul '22	1. Lanjutan pekerjaan pelapisan dan pengecatan gypsum untuk ruangan Tug Simulator, Instructor dan Bridge Simulator	
	2. Penarikan kabel dari panel utama ke panel dalam ruangan 3. Pemasangan kabel tray untuk panel box utama ruangan 4. Penyelesaian pembuatan dan pemasangan panel box listrik	

PREPARE BY: M. Fajri Ramdani

APPROVED BY: Donny Saksono

2 Jul '22	1. Lanjutan pekerjaan pelapisan dan pengecatan gypsum untuk ruangan Tug Simulator, Instructor dan Bridge Simulator 2. Pemasangan kusen pitu di ruangan Ship Stability dan CBT	
	3. Penarikan kabel lampu plafon ruang Bridge Simulator dan Tug Simulator 4. Penarikan kabel AC, stop kontak saklar listrik ruang instructor atas dan bawah 5. Pemasangan panel box ruang Bridge dan Tug Simulator	
3 Jul '22	1. Lanjutan pekerjaan pelapisan dan pengecatan gypsum untuk ruangan Tug Simulator, Instructor dan Bridge Simulator 2. Pemasangan standing TV Tug Simulator 3. Pemasangan kusen ruang Instructor dan Bridge Simulator	
	4. Pemasangan panel box dan penarikan kabel dari panel utama ke ruang Ship Stabiliti / CBT 5. Lanjutan pemasangan kabel lampu dan kabel jaringan (LAN)	
