

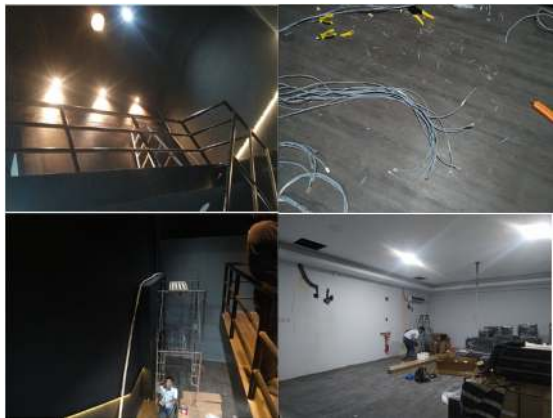
WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	22 Agustus 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	28 Agustus 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
22 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pemasangan <i>console Tug Simulator</i> dan 2. pengecatan bagian dalam dan ruang instruktur <i>Tug Simulator</i>	
	<u>JARINGAN LISTRIK:</u> 3. Crimping dan testing kabel LAN ruangan <i>ship stability, bridge</i> dan instruktur <i>bridge simulator</i> dan 4. Pemasangan AC ruang <i>bridge simulator</i> dan pemindahan titik lampu gantung ruang lobi.	

23 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Lanjutan pemasangan vinyl lobi dan 2. Pembuatan jalur pembuangan AC di ruang debriefing.	  
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 3. Pemasangan konektor C20 dan C14 pada kabel output UPS untuk ruang <i>ship stability</i>, <i>Tug</i> dan <i>Bridge Simulator</i> dan 4. Pemindahan 2 unit AC di ruang <i>Tug Simulator</i>.	   
24 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pemasangan <i>back drop</i> ruang <i>instructor bridge simulator</i>.	
	2. Pengiriman Hardware dan elektronik lainnya ke Gedung Agung Gumelar	 

	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 3. Penempatan UPS di ruangan <i>Ship stability</i> dan <i>Tug Simulator</i>; 4. Perapian kabel LAN di ruangan <i>Bridge Simulator</i>; 5. Penyambungan aliran listrik dari panel utama gedung ke panel ruang <i>simulator</i>; 6. Penyambungan aliran listrik dari panel ruangan <i>Tug Simulator</i> ke panel utama dan 7. Penyambungan aliran listrik dari panel ruang <i>bridge</i> ke panel utama.	
25 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Lanjutan pemasangan vinyl lobi dan 2. Pembuatan box lampu untuk <i>instructor bridge simulator</i>.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 3. Pemasangan UPS untuk ruang <i>Ship stability</i>, <i>Tug 1</i>, <i>Tug2</i> dan <i>Bridge Simulator</i>; 4. Pemasangan steker AC di ruang <i>ship stability</i> dan <i>Bridge Simulator</i>.	
26 Aug '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Lanjutan pemasangan vinyl lobi	

	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 2. Pemasangan stop kontak di ruang bridge simulator dan 3. Pemasangan <i>switch panel</i> untuk kabel LAN ruang <i>Bridge Simulator</i>.	
27 Aug '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Pemasangan vinyl di akses sebelum masuk lobi.	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 2. Pemasangan <i>spot light</i> di akses ruang <i>bridge simulator</i>; 3. Pemasangan LAN ruang <i>Tug Simulator</i>; 4. Pemasangan selang pembuangan air AC ruang <i>debriefing</i> dan pemasangan AC di ruang <i>debriefing</i>.	

28 Aug '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Perbaikan pintu utama masuk ruangan FMSS; 2. Pembuatan box tutup selang pembuangan air AC	
	<u>JARINGAN KELISTRIKAN:</u> 1. Pemasangan stop kontak dan steker di ruangan <i>Tug Simulator</i> dan 2. Perapihan kabel LAN di ruangan <i>Tug Simulator</i>.	
