


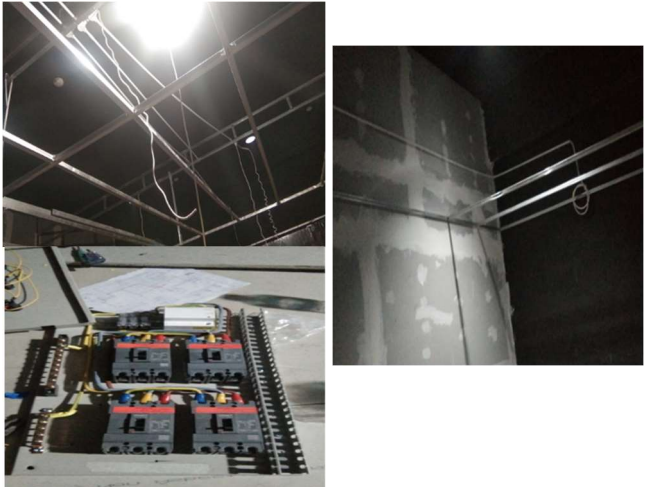


WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	04 Juli 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	08 Juli 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
4 Jul '22	1. Pemasangan rangka plafon ruang <i>Bridge Simulator, instructor</i> dan <i>Ship Stability/CBT</i>; 2. Pemasangan partisi ruang <i>Bridge</i> dan <i>maintenance</i>.	
	3. Lanjutkan proses penarikan kabel listrik ukuran 4X16mm dari panel utama ke ruang <i>ship stability / CBT</i>; 4. Lanjutan pemasangan panel box di ruang <i>Ship Stability/ CBT</i>; 5. Lanjutan penarikan kable lampu untuk plafon Tug Simulator; 6. Lanjutan penarikan kable LAN di ruang <i>Ship stability/ CBT</i>.	

5 Jul '22	1. Lanjutan pemasangan rangka plafon ruang <i>Bridge Simulator</i>, <i>Ship Stability</i>/CBT dan <i>Instructor</i>; 2. Lanjutan proses pemasangan partisi untuk sekat ruang <i>Bridge simulator</i> dan <i>maintenance</i>.	
	3. Pembuatan jalur AC ruang <i>instructor</i> lantai 1 4. Penarikan kabel jalur AC dan stop kontak ruang <i>instructor</i> lantai 1; 5. Pembuatan jalur saklar, lampu tangga, jalur AC dan lampu untuk ruang instruktur lantai 2 6. Jumper lampu di ruang <i>bridge</i> lantai 2 sebagai saklar <i>dimmer</i>; 7. Penarikan jalur stop kontak dan saklar lampu instruktur lantai 1; 8. Perarikan panel untuk <i>Bridge simulator</i>.	
6 Jul '22	1. Bongkar material Gypsum 9mm, hollow dan baja ringan ke ruang pekerjaan dan memuat material sisa2 pekerjaan	

	2. Lanjutan penarikan jalur AC, saklar dan stop kontak untuk ruang instruktur lantai 2 dari ruang <i>bridge simulator</i> lantai 1; 3. Pemasangan 3 titik lampu di ruang <i>ship stability/CBT</i>; 4. Pemasangan 1 titik lampu di ruang <i>bridge simulator</i>; 5. Perakitan panel listrik untuk <i>bridge simulator</i>.	 
7 Jul '22	1. Lanjutan proses Tarik kabel jalur AC, saklar dan stop kontak ruang instruktur lantai 2 dari ruang <i>bridge simulator</i> lantai 1 dan ruangan <i>ship stability/CBT</i>; 2. Penarikan kabel lampu gantung plafon utama; 3. Lanjutan rakit panel listrik untuk <i>bridge simulator</i>.	 
	1. Instalasi software ship stability: instalasi Loadicator untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan kestabilan Kapal	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410

Telephone: 021-2605 1621

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com

**PT. AMAN REJEKI INDONESIA**

Integrated Solutions

8 Jul '22	1. Lanjutan perakitan dan pemasangan panel <i>box Tug Simulator</i>, UPS dan 2. Pemasangan 2 unit lampu di lorong ruang <i>exit</i>.	
-----------	--	--

PREPARE BY: M. Fajri Ramdani

APPROVED BY: Donny Saksono
